


Netzplan DiviBAU

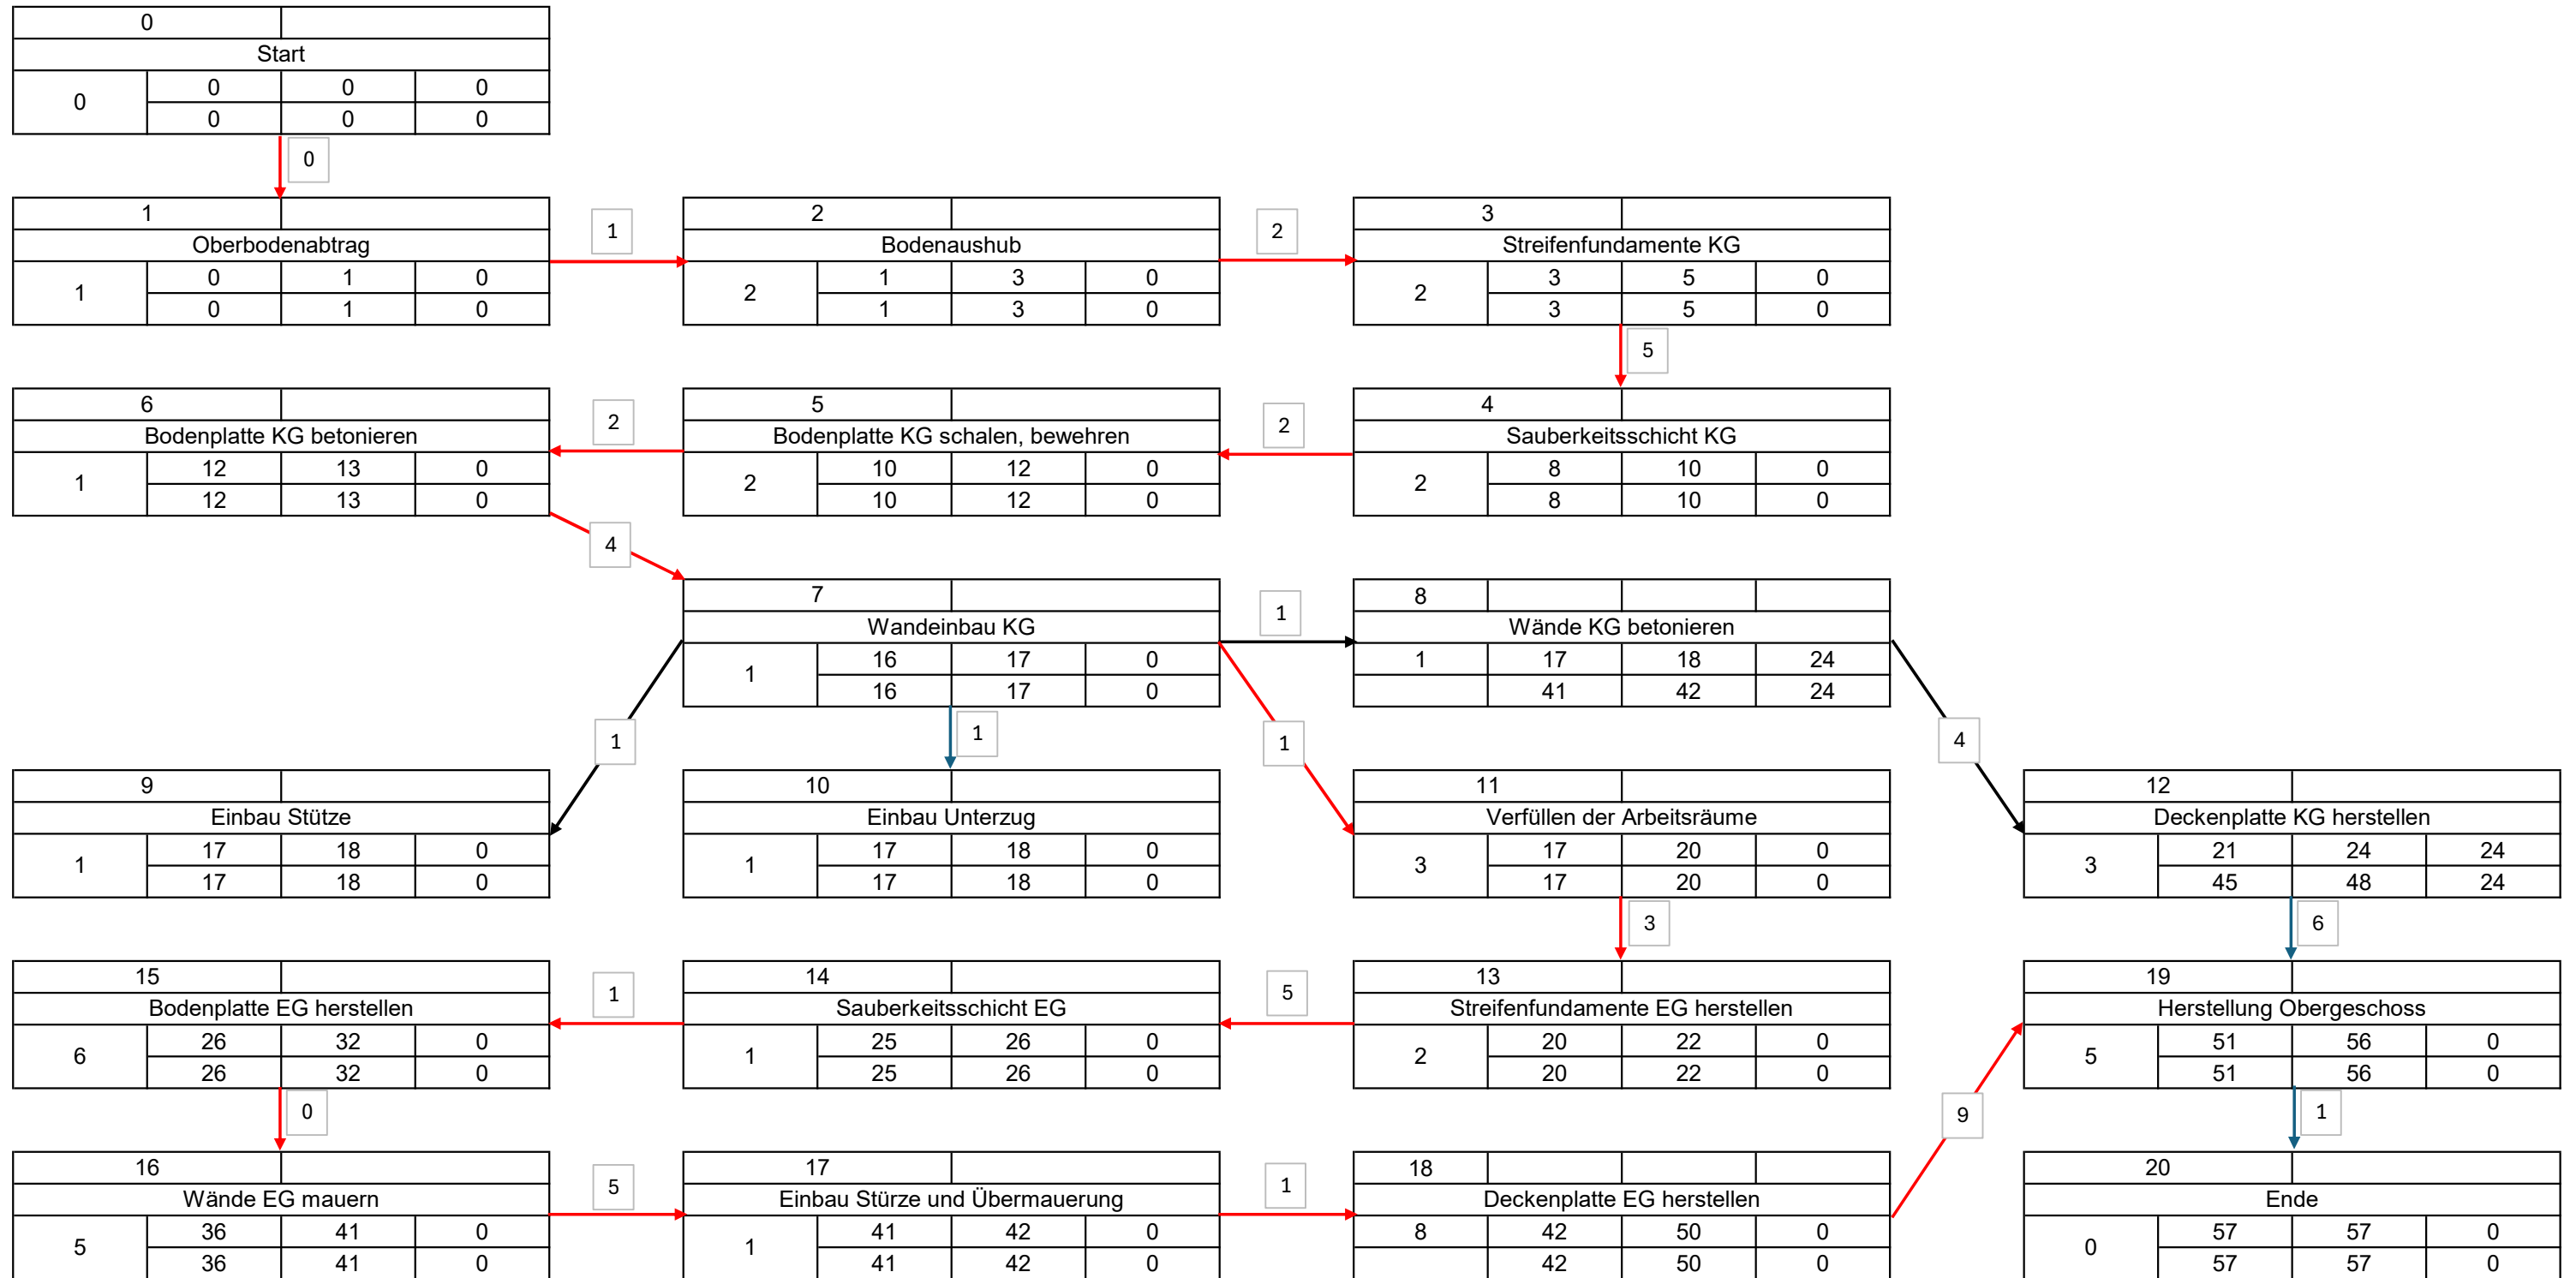

Terminplan DiviBau																																	
Nr.	Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgäng	Januar 2024											Februar 2024											März 2024				
							27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	02	05	08	11	
1		Oberbodenabtrag	1 Tag	Mon 01.01.24	Mon 01.01.24																												
2		Bodenaushub	2 Tage	Die 02.01.24	Mit 03.01.24	1																											
3		Streifenfundamente KG schalen, bewehren, betonieren	2 Tage	Don 04.01.24	Fre 05.01.24	2																											
4		Trocknung Beton Vorgang 3	2 Tage	Mon 08.01.24	Die 09.01.24	3																											
5		Sauberkeitsschicht KG herstellen	2 Tage	Mit 10.01.24	Don 11.01.24	4																											
6		Bodenplatte KG schalen + bewehren	2 Tage	Fre 12.01.24	Mon 15.01.24	5																											
7		Bodenplatte KG betonieren	1 Tag	Die 16.01.24	Die 16.01.24	6																											
8		Trocknung Beton Vorgang 7	3 Tage	Mit 17.01.24	Fre 19.01.24	7																											
9		Wände KG - Einbau als Elementwand	1 Tag	Mon 22.01.24	Mon 22.01.24	8																											
10		Wände KG betonieren	1 Tag	Die 23.01.24	Die 23.01.24	9																											
11		Trocknung Beton Vorgang 10	3 Tage	Mit 24.01.24	Fre 26.01.24	10																											
12		Einbau Stütze	1 Tag	Die 23.01.24	Die 23.01.24	9																											
13		Verfüllen der Arbeitsräume	3 Tage	Die 23.01.24	Don 25.01.24	9																											
14		Unterzug einbauen	1 Tag	Die 23.01.24	Die 23.01.24	9																											
15		Deckenplatte KG - Filigrandecke verlegen	1 Tag	Mon 29.01.24	Mon 29.01.24	11																											
16		Deckenplatte KG schalen	1 Tag	Die 30.01.24	Die 30.01.24	15																											
17		Deckenplatte KG betonieren	1 Tag	Mit 31.01.24	Mit 31.01.24																												

Vorgang Manueller Vorgang Kritisch
