Terminplan DiviBau

Nr.	Vorgangsr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgäng
1		Oberbodenabtrag	1 Tag	Mon 01.01.24	Mon 01.01.24	
2		Bodenaushub	2 Tage	Die 02.01.24	Mit 03.01.24	1
3		Streifenfundamente KG schalen, bewehren, betonieren	2 Tage	Don 04.01.24	Fre 05.01.24	2
4		Trocknung Beton Vorgang 3	2 Tage	Mon 08.01.24	Die 09.01.24	3
5		Sauberkeitsschicht KG herstellen	2 Tage	Mit 10.01.24	Don 11.01.24	4
6		Bodenplatte KG schalen + bewehren	2 Tage	Fre 12.01.24	Mon 15.01.24	5
7		Bodenplatte KG betonieren	1 Tag	Die 16.01.24	Die 16.01.24	6
8		Trocknung Beton Vorgang 7	3 Tage	Mit 17.01.24	Fre 19.01.24	7
9		Wände KG - Einbau als Elementwand	1 Tag	Mon 22.01.24	Mon 22.01.24	8
10		Wände KG betonieren	1 Tag	Die 23.01.24	Die 23.01.24	9
11		Trocknung Beton Vorgang 10	3 Tage	Mit 24.01.24	Fre 26.01.24	10
12		Einbau Stütze	1 Tag	Die 23.01.24	Die 23.01.24	9
13		Verfüllen der Arbeitsräume	3 Tage	Die 23.01.24	Don 25.01.24	9
14		Unterzug einbauen	1 Tag	Die 23.01.24	Die 23.01.24	9
15		Deckenplatte KG - Filigrandecke verlegen	1 Tag	Mon 29.01.24	Mon 29.01.24	11
16		Deckenplatte KG schalen	1 Tag	Die 30.01.24	Die 30.01.24	15
17		Deckenplatte KG betonieren	1 Tag	Mit 31.01.24	Mit 31.01.24	16
18		Trocknung Beton Vorgang 17	3 Tage	Don 01.02.24	Mon 05.02.24	17
19		Streifenfundamente EG schalen	1 Tag	Fre 26.01.24	Fre 26.01.24	13
20		Streifenfundamente EG bewehren + betonieren	1 Tag	Mon 29.01.24	Mon 29.01.24	19
21		Trocknung Beton Vorgang 20	3 Tage	Die 30.01.24	Don 01.02.24	20
22		Sauberkeitsschicht EG herstellen	1 Tag	Fre 02.02.24	Fre 02.02.24	21
23		Bodenplatte EG schalen	2 Tage	Mon 05.02.24	Die 06.02.24	22
24		Bodenplatte EG bewehren	2 Tage	Mit 07.02.24	Don 08.02.24	23
25		Bodenplatte EG betonieren	2 Tage	Fre 09.02.24	Mon 12.02.24	24
26		Trocknung Beton Vorgang 25	4 Tage	Die 13.02.24	Fre 16.02.24	25
27		Wände EG MW herstellen	5 Tage	Mon 19.02.24	Fre 23.02.24	26
28		Stürze einbauen, Übermauern	1 Tag	Mon 26.02.24	Mon 26.02.24	27
29		Deckenplatte EG - Filigrandecke verlegen	3 Tage	Die 27.02.24	Don 29.02.24	28
30		Deckenplatte EG schalen	2 Tage	Fre 01.03.24	Mon 04.03.24	29
31		Deckenplatte EG betonieren	3 Tage	Die 05.03.24	Don 07.03.24	30
32		Trocknung Beton 31	1 Tag	Fre 08.03.24	Fre 08.03.24	31
33		Gesamtzeit	50 Tage	Mon 01.01.24	Fre 08.03.24	

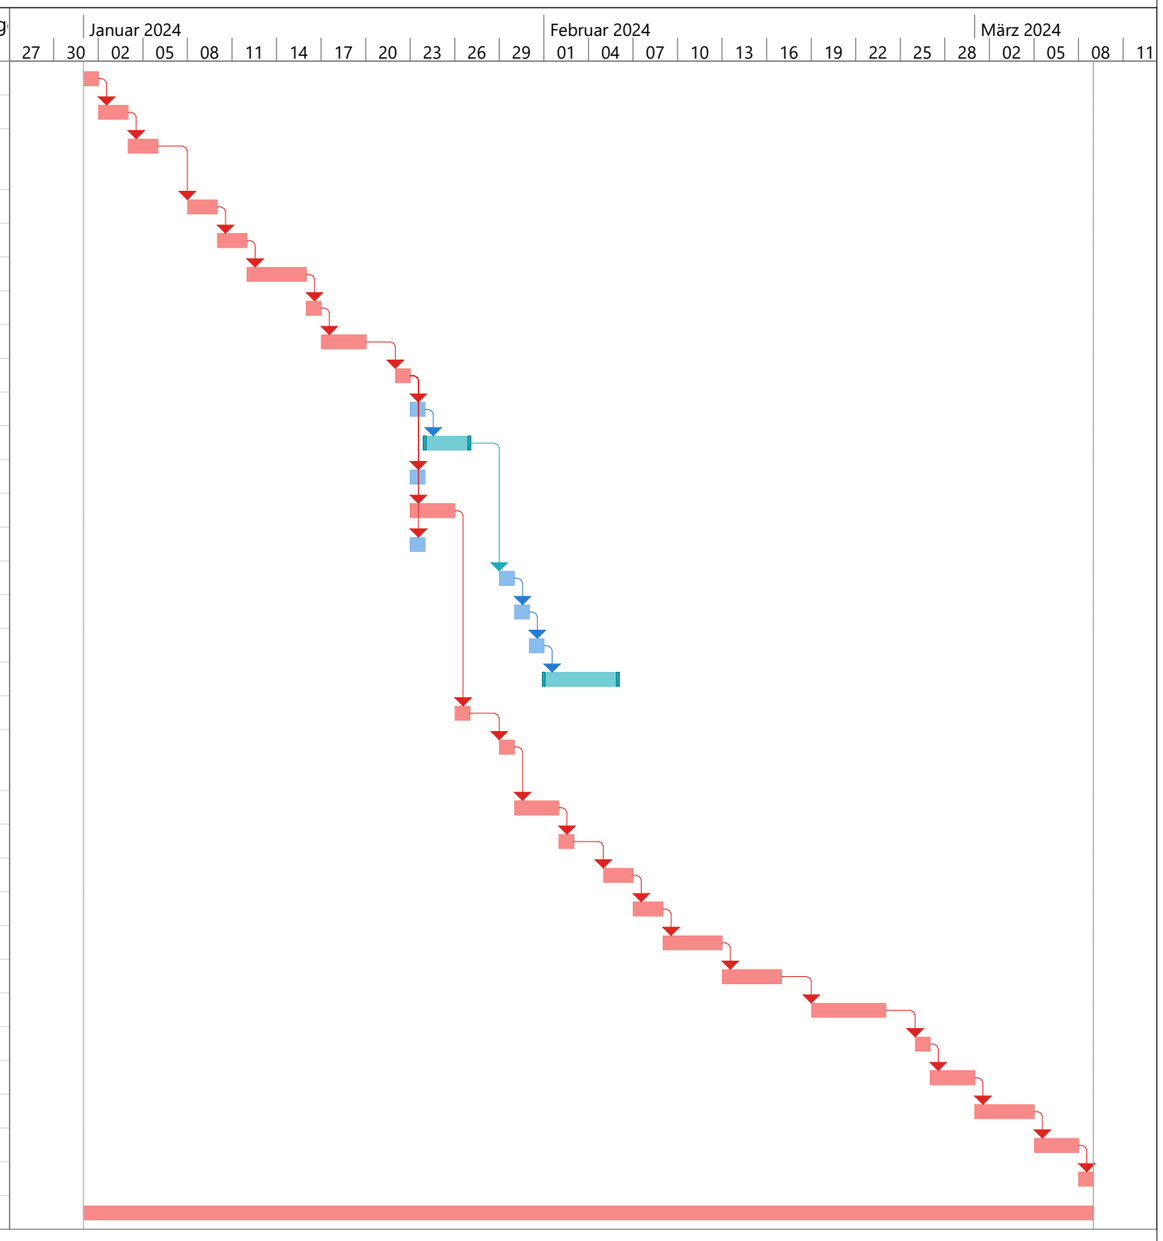

Projekt: Vorgangsliste_DiviBau
Datum: Mon 08.04.24

Vorgang	Inaktiver Vorgang	Manueller Sammelrollup	Externer Meilenstein	Manueller Fortschritt
Unterbrechung	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelvorgang	Stichtag	
Meilenstein	Inaktiver Sammelvorgang	Nur Anfang	Kritisch	
Sammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Ende	Kritische Unterbrechung	
Projektsammelvorgang	Nur Dauer	Externe Vorgänge	In Arbeit	
